

# Experto Universitario Gestión de Obras



## Experto Universitario Gestión de Obras

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 meses**
- » Titulación: **TECH Universidad ULAC**
- » Acreditación: **24 ECTS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: [www.techtitute.com/ingenieria/experto-universitario/experto-gestion-obras](http://www.techtitute.com/ingenieria/experto-universitario/experto-gestion-obras)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Dirección del curso

---

*pág. 12*

04

Estructura y contenido

---

*pág. 16*

05

Metodología

---

*pág. 22*

06

Titulación

---

*pág. 30*

# 01

# Presentación

La Gestión de Obras es una parte fundamental que el ingeniero civil debe conocer en profundidad para controlar que todas las partes del proyecto sean acordes a los objetivos y se desarrollen de manera correcta. El estudiante podrá sumergirse en este programa 100% online que le permitirá aumentar sus capacidades y ser más competitivo en su profesión.





“

*La seguridad y la salud son imprescindibles en cualquier obra, por lo que hay que tener en cuenta los aspectos más novedosos en esta materia”*

La Gestión de las Obras es una de las partes fundamentales que tiene que llevar a cabo el profesional de la ingeniería civil, ya que las fases previas a la construcción, como la contratación y la planificación de la misma, así como los procesos de seguridad y salud hacia los trabajadores, o el cierre y liquidación de la obra son aspectos que tienen que quedar claramente definidos para que no haya errores en la programación y el desarrollo de la obra.

En el programa se hará hincapié en las herramientas existentes para la búsqueda de licitaciones y para la redacción de las ofertas. Además, se estudiará la contratación de ámbito internacional a través de organismos multilaterales y de contratación directa en el ámbito internacional.

En el ámbito de la Gestión de Obras, ha surgido la figura del PMP, que abarca los proyectos en toda su amplitud y que se ha convertido en indispensable de cara a optimizar recursos dentro de la vida de un proyecto. Así, se relatarán las herramientas necesarias para realizar el control de presupuesto, costes, compras, planificación y certificación; y se darán conocimientos de gestión de personal haciendo hincapié en la planificación del equipo humano y la gestión de este.

Además, el ingeniero de caminos debe tener un compromiso firme con la seguridad y la salud en las obras, tanto por las connotaciones éticas de cuidado de los empleados como por las responsabilidades que se pueden derivar de una mala praxis de la profesión. Por todo esto, en la Especialización se estudiarán los aspectos más importantes a tener en cuenta para el desarrollo de las obras y las herramientas que han surgido para mejorar el seguimiento de la seguridad y salud dentro de las obras.

Por último, el alumno también conocerá las herramientas que hay que manejar para conseguir un cierre óptimo de la obra. La liquidación y cierre de obras es un punto de gran importancia puesto que un cierre inadecuado puede repercutir en un sobrecoste en el momento del cierre y otro diferido en el tiempo que puede empeorar el resultado económico de la obra.

Cabe destacar que al tratarse de un Experto Universitario 100% online, el alumno no está condicionado por horarios fijos ni necesidad de trasladarse a otro lugar físico, sino que puede acceder a los contenidos en cualquier momento del día, equilibrando su vida laboral o personal con la académica.

Este **Experto Universitario en Gestión de Obras** contiene el programa más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en infraestructura e ingeniería civil
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras en gestión de obras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



*La realización de este Experto Universitario colocará a los profesionales de la ingeniería civil a la vanguardia de las últimas novedades en el sector”*

“

*Este Experto Universitario es la mejor inversión que puedes hacer en la selección de un programa de actualización en el ámbito de la ingeniería civil. Te ofrecemos calidad y libre acceso a los contenidos”*

Incluye, en su cuadro docente, a profesionales pertenecientes al ámbito de la ingeniería civil, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa educativo se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en Gestión de Obras y con gran experiencia.

*Esta especialización cuenta con el mejor material didáctico, lo que te permitirá un estudio contextual que te facilitará el aprendizaje.*

*Este Experto Universitario 100% online te permitirá compaginar tus estudios con tu labor profesional. Tú eliges donde y cuando formarte.*



# 02 Objetivos

El Experto Universitario en Gestión de Obras está orientado a facilitar la actuación del profesional para que adquiera y conozca las principales novedades en este ámbito, lo que le permitirá ejercer su profesión con la máxima calidad y profesionalidad.







“

*Nuestro objetivo es que te conviertas en el mejor profesional en tu sector. Y para ello contamos con la mejor metodología y contenido”*



## Objetivos generales

---

- ◆ Adquirir nuevos conocimientos en ingeniería e infraestructuras civiles
- ◆ Adquirir nuevas competencias en cuanto a nuevas tecnologías, últimas novedades en maquinaria y software, conocimiento de los próximos pasos a seguir y el reciclado
- ◆ Extrapolar estos conocimientos a otros sectores de la industria, centrándose en aquellos campos que mayor cantidad de personal formado y cualificado requieren año tras año
- ◆ Tratar los datos generados en las actividades de la ingeniería civil a través del ámbito BIM, una realidad de obligado cumplimiento para la redacción, construcción, gestión y explotación de infraestructuras



*Una experiencia de capacitación única, clave y decisiva para impulsar tu desarrollo profesional”*





## Objetivos específicos

---

### Modulo 1. Contratación y fases previas de obra

- ♦ Analizar los tipos de contratos existentes en el mundo de la ingeniería civil
- ♦ Tener conocimientos para el análisis de las solvencias de cada empresa
- ♦ Adquirir las habilidades para la elaboración de ofertas técnicas y económicas
- ♦ Estudiar la utilización del software más adecuado para la elaboración de ofertas
- ♦ Profundizar acerca de la figura del Contract Manager
- ♦ Preparar los procesos necesarios para el comienzo administrativo de una obra y las últimas novedades existentes a este respecto
- ♦ Conocer los documentos en el ámbito de la Seguridad y Salud, medidas medio ambientales y de gestión de residuos necesarios para el desarrollo de la obra.
- ♦ Tener conocimientos necesarios para la correcta implantación de las instalaciones auxiliares de obra
- ♦ Conocer la internacionalización de la empresa en la que desarrolle sus funciones el alumno

### Modulo 2. Planificación de obra (PMP)

- ♦ Conocer la figura del PMP
- ♦ Adiestrarse acerca de la gestión de proyectos desde el ámbito del tiempo, organización, económico y de recursos humanos
- ♦ Tener una formación necesaria para la mejora de la comunicación del profesional con clientes y proveedores
- ♦ Adquirir las habilidades para la correcta gestión de compras.
- ♦ Tener capacidad de análisis para la optimización de resultados en el desarrollo de cada proyecto
- ♦ Conocer las herramientas de software adecuadas para la planificación, seguimiento y cierre de obras

### Modulo 3. Seguridad y salud y PACMA

- ♦ Aprender la normativa vigente en el ámbito de la Seguridad y la Salud
- ♦ Tener las pautas necesarias para la redacción y gestión de los documentos de Seguridad y Salud necesarios. ESS y PSS
- ♦ Tener un recorrido alrededor de los intervinientes en el organigrama de Seguridad y Salud de las obras
- ♦ Adiestrarse acerca documentación que se generará en las obras
- ♦ Desarrollar las últimas herramientas existentes de cara a la gestión de documentación
- ♦ Formarse acerca de la operativa en obra para realizar las acciones necesarias para asegurar la seguridad de los trabajadores y su salud
- ♦ Desarrollar el documento del PACMA
- ♦ Elaborar el plan de ensayos
- ♦ Realizar la gestión de residuos durante la ejecución de la obra

### Modulo 4. Liquidación y cierre de obra

- ♦ Preparar la documentación necesaria para la preparación de la liquidación y cierre de obra
- ♦ Formarse para realización de las mediciones generales de la obra
- ♦ Conocer las últimas herramientas existentes de cara a la realización de las mediciones de campo
- ♦ Desarrollar conocimientos acerca de los métodos para cerrar las no conformidades abiertas durante el transcurso de la obra
- ♦ Detectar y crear precios contradictorios
- ♦ Formarse en negociación de cara a la discusión con el cliente para el cierre económico de la obra
- ♦ Realizar el seguimiento y la apertura de expedientes adicionales al de la propia obra como es el de la revisión de precios. como es el de la revisión de precios

03

# Dirección del curso

En nuestra universidad contamos con profesionales especializados en cada área del conocimiento, que vierten en nuestras formaciones la experiencia de su trabajo.



“

*En nuestra universidad trabajan los mejores profesionales de todas las áreas que vierten su conocimiento para ayudarte”*

## Dirección



### **D. Uriarte Alonso, Mario**

- ♦ Director y Fundador de Candois Ingenieros Consultores
- ♦ Jefe de obra y de producción de COPISA
- ♦ Jefe de obra Eiffage
- ♦ Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria



### **D. Torres Torres, Julián**

- ♦ Ingeniero Civil
- ♦ Jefe de Producción de Ferrovial Agroman
- ♦ Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada
- ♦ Experto en Construcción Sostenible por la Universidad de Granada
- ♦ Grado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED



## Profesores

### D. Gómez Martín, Carlos

- ◆ Consultor independiente de Ingeniería Civil y BIM
- ◆ Modelador BIM en AECOM
- ◆ Consultor tecnológico en el sector educación y empresas en Rossellimac
- ◆ Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
- ◆ Máster BIM en Ingeniería Civil

“

*En nuestra universidad trabajan los mejores profesionales de todas las áreas que vierten su conocimiento para ayudarte”*

04

# Estructura y contenido

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del sector de la ingeniería civil, con una amplia trayectoria y reconocido prestigio en la profesión, y conscientes de los beneficios que la última tecnología educativa puede aportar a la enseñanza superior.







“

*Contamos con el programa más completo y actualizado del mercado. Buscamos la excelencia y que tú también la logres”*

## Módulo 1. Contratación y fases previas de obra

- 1.1. Elección de tipo de contratos a ofertar y localización de contratos
  - 1.1.1. Identificación objetivos de contratación
  - 1.1.2. Plataformas de contratación
  - 1.1.3. Conocimiento y análisis del cliente
  - 1.1.4. Análisis solvencia financiera
  - 1.1.5. Análisis solvencia técnica
  - 1.1.6. Elección contratos a ofertar
- 1.2. Análisis solvencias requeridas
  - 1.2.1. Análisis solvencia financiera
  - 1.2.2. Análisis solvencia técnica
  - 1.2.3. Análisis necesidad socios en UTE
  - 1.2.4. Negociación formación UTE
- 1.3. Elaboración oferta económica
  - 1.3.1. Desglose presupuesto proyecto
  - 1.3.2. Petición de ofertas para estudio
  - 1.3.3. Planteamiento de hipótesis
  - 1.3.4. Cierre oferta económica / riesgo
- 1.4. Redacción técnica de ofertas
  - 1.4.1. Estudio pliegos y proyecto base de licitación
  - 1.4.2. Redacción memoria técnica
  - 1.4.3. Redacción programa de trabajos
  - 1.4.4. Documentos SYS y PACMA
  - 1.4.5. Mejoras
- 1.5. Análisis contrato (*contract manager*)
  - 1.5.1. Figura del *contract manager*
  - 1.5.2. Oportunidades de la figura del *contract manager*
  - 1.5.3. Formación del *contract manager*
- 1.6. Redacción PSS y apertura centro de trabajo
  - 1.6.1. Redacción PSS
  - 1.6.2. Aprobación PSS y apertura del centro de trabajo
  - 1.6.3. El libro de incidencias
- 1.7. Redacción del PACMA y del plan de gestión de residuos
  - 1.7.1. Análisis documentación ambiental del proyecto
  - 1.7.2. Análisis de características ambientales de la zona de actuación
  - 1.7.3. Conocimiento de la legislación ambiental vigente
  - 1.7.4. Adecuación del PACMA de la empresa al proyecto
  - 1.7.5. Elaboración del plan para la gestión de RCDS
- 1.8. Instalaciones de obra, logística, replanteo de las obras
  - 1.8.1. Análisis de necesidades de zonas de acopio e instalaciones
  - 1.8.2. Estudio de materiales e instalaciones necesarias para zona de implantación
  - 1.8.3. Implantación
  - 1.8.4. Levantamiento topográfico de la obra
  - 1.8.5. Drones y topografía
  - 1.8.6. Comprobación en gabinete de datos topográficos
  - 1.8.7. Firma del acta de replanteo
- 1.9. Licitaciones internacionales multilaterales
  - 1.9.1. Organismos multilaterales
  - 1.9.2. Ventajas de la licitación multilateral
  - 1.9.3. Búsqueda de oportunidades en el mercado multilateral
  - 1.9.4. Implantación de cara a la licitación multilateral
    - 1.9.4.1. Países de interés
    - 1.9.4.2. Marco regulatorio
    - 1.9.4.3. *Partner* local
    - 1.9.4.4. Solvencia técnica y económica de cara a la internacionalización
    - 1.9.4.5. Desarrollo de contratos internacionales
    - 1.9.4.6. Riesgos de la internacionalización de la empresa
- 1.10. Internacionalización de la empresa
  - 1.10.1. Países de interés
  - 1.10.2. Marco regulatorio
  - 1.10.3. *Partner* local
  - 1.10.4. Solvencia técnica y económica de cara a la internacionalización
  - 1.10.5. Desarrollo de contratos internacionales
  - 1.10.6. Riesgos de la internacionalización de la empresa

## Módulo 2. Planificación de obra (PMP)

- 2.1. Introducción y ciclo de vida
  - 2.1.1. Definición de proyecto y dirección de proyectos
  - 2.1.2. Áreas de experiencia
  - 2.1.3. Ciclo de vida
  - 2.1.4. Interesados
  - 2.1.5. Influencia de la dirección
- 2.2. Procesos de dirección
  - 2.2.1. Procesos de dirección de proyectos de explotación y mantenimiento
  - 2.2.2. Grupos de procesos de dirección
  - 2.2.3. Interacciones entre procesos
- 2.3. Gestión de la integración
  - 2.3.1. Desarrollo del acta de constitución
  - 2.3.2. Desarrollo del enunciado del alcance
  - 2.3.3. Desarrollo del plan de gestión
  - 2.3.4. Dirección y gestión de la ejecución
  - 2.3.5. Supervisión y control del trabajo
  - 2.3.6. Control integrado de cambios
  - 2.3.7. Cierre del proyecto
- 2.4. Gestión del alcance
  - 2.4.1. Planificación del alcance
  - 2.4.2. Definición del alcance
  - 2.4.3. Creación de EDT
  - 2.4.4. Verificación de alcance
  - 2.4.5. Cierre del alcance
- 2.5. Gestión del tiempo
  - 2.5.1. Definición de las actividades
  - 2.5.2. Establecimiento de secuencia de actividades
  - 2.5.3. Estimación de recursos
  - 2.5.4. Estimación de la duración
  - 2.5.5. Desarrollo del cronograma
- 2.6. Gestión de los costes
  - 2.6.1. Estimación de los costes
  - 2.6.2. Preparación de un presupuesto de costes
  - 2.6.3. Control de los costes y desviaciones
- 2.7. Gestión de recursos humanos
  - 2.7.1. Control del cronograma
  - 2.7.2. Planificación de los recursos humanos
  - 2.7.3. Formación del equipo
  - 2.7.4. Desarrollo del equipo
  - 2.7.5. Gestión del equipo humano
  - 2.7.6. Modelos organizativos de recursos humanos
  - 2.7.7. Teorías sobre la organización de los recursos humanos
- 2.8. Las comunicaciones en la gestión
  - 2.8.1. Planificación de las comunicaciones
  - 2.8.2. Distribución de la información
  - 2.8.3. Informar del rendimiento
  - 2.8.4. Gestión de los interesados
- 2.9. Gestión de riesgos
  - 2.9.1. Planificación de la gestión de riesgos
  - 2.9.2. Identificación de riesgos
  - 2.9.3. Análisis cualitativo de riesgos
  - 2.9.4. Análisis cuantitativo de riesgos
  - 2.9.5. Planificación de la respuesta ante riesgos
  - 2.9.6. Seguimiento y control de riesgos
- 2.10. Gestión de las adquisiciones
  - 2.10.1. Planificar compras y adquisiciones
  - 2.10.2. Planificar la contratación
  - 2.10.3. Solicitar respuestas de vendedores
  - 2.10.4. Administración del contrato
  - 2.10.5. Cierre del contrato

### Módulo 3. Seguridad y salud y PACMA

- 3.1. Norma de aplicación relativas a la SYS
  - 3.1.1. Normativa nacional
  - 3.1.2. Normativa internacional
  - 3.1.3. Implicaciones y responsabilidades de los intervinientes en la SYS de la obra
- 3.2. Estudio de seguridad y salud y PSS
  - 3.2.1. Estudio de seguridad y salud
  - 3.2.2. Plan de seguridad y salud
  - 3.2.3. Fases de redacción de ambos documentos
  - 3.2.4. Implicación y responsabilidades de los autores del ESS y del PSS
- 3.3. Figuras dentro del organigrama de obra
  - 3.3.1. Coordinador de SYS
  - 3.3.2. Recursos preventivos de la empresa
  - 3.3.3. Servicio de prevención
  - 3.3.4. Trabajadores
- 3.4. Documentación imprescindible
  - 3.4.1. Documentación previa al comienzo de las obras
  - 3.4.2. Documentación relativa trabajadores
  - 3.4.3. Documentación relativa a maquinaria
  - 3.4.4. Documentación relativa a empresa
- 3.5. Instalaciones, protecciones individuales y colectivas
  - 3.5.1. Instalaciones de obra
  - 3.5.2. Protecciones individuales
  - 3.5.3. Protecciones colectivas
- 3.6. PACMA
  - 3.6.1. Definición del PACMA
  - 3.6.2. Redacción del PACMA
  - 3.6.3. Seguimiento del PACMA en obra
  - 3.6.4. Auditorías externas e internas
  - 3.6.5. Valor añadido del PACMA en obra

- 3.7. Control de ensayos en obra
  - 3.7.1. Plan de ensayos
  - 3.7.2. Planificación del plan de ensayos
  - 3.7.3. Figuras encargadas del seguimiento del plan de ensayos
  - 3.7.4. Importancia del plan de ensayos dentro de la obra
- 3.8. Documentación generada en obra relativa al PACMA
  - 3.8.1. Documentación relativa al PACMA
  - 3.8.2. Documentación relativa a medio ambiente
  - 3.8.3. Nuevas herramientas para el control del PACMA
  - 3.8.4. Intervinientes en el seguimiento de documentación generada relativa al PACMA
- 3.9. Seguimiento ambiental de la obra
  - 3.9.1. Legislación nacional e internacional en materia ambiental
  - 3.9.2. Pautas marcadas en el seguimiento ambiental de la obra
  - 3.9.3. Utilización de materiales reciclados y valorización de materiales
  - 3.9.4. Reducción de la huella del carbono en obra
- 3.10. Gestión de residuos
  - 3.10.1. Plan de gestión de residuos
  - 3.10.2. Legislación relativa a la gestión de residuos
  - 3.10.3. Gestión de residuos peligrosos
  - 3.10.4. Valorización de RCDS

### Módulo 4. Liquidación y cierre de obra

- 4.1. Trabajos previos a la finalización de obra
  - 4.1.1. Seguimiento mensual de mediciones de obra
  - 4.1.2. Seguimiento mensual de no conformidades
  - 4.1.3. Seguimiento mensual de nuevas partidas en proyecto
  - 4.1.4. Gestión administrativa en caso de existencia de modificados
- 4.2. Medición final de la obra
  - 4.2.1. Intervinientes en la medición final de la obra
  - 4.2.2. Planificación para la medición final de la obra
  - 4.2.3. Coordinación de las mediciones de la obra
  - 4.2.4. Discusión con el cliente de la medición final de la obra

- 4.3. Revisión de planos finales de obra
  - 4.3.1. Control de planos vigentes
  - 4.3.2. Delineación final de planos
  - 4.3.3. Presentación de planos *As Built*
- 4.4. Revisión no conformidades
  - 4.4.1. Seguimiento y cierre de no conformidades a lo largo del desarrollo de la obra
  - 4.4.2. Importancia de las no conformidades
  - 4.4.3. Revisión final de no conformidades generadas a lo largo de la obra
- 4.5. Negociación precios contradictorios
  - 4.5.1. Definición de precio contradictorio
  - 4.5.2. Negociación de precio contradictorio
  - 4.5.3. Cierre de precio contradictorio
- 4.6. Negociación cierre económico y legal de obra
  - 4.6.1. Resumen de datos para cierre de obra
  - 4.6.2. Negociación económica para cierre de obra
  - 4.6.3. Cierre legal y administrativo de obra
  - 4.6.4. Expedientes en curso
- 4.7. Adecuación zonas afectadas de la obra
  - 4.7.1. Definición de zonas afectadas durante el desarrollo de las obras
  - 4.7.2. Medidas a lo largo de la ejecución de las obras
  - 4.7.3. Medidas en zonas afectadas para el cierre de la obra
  - 4.7.4. Restauración final de la obra
- 4.8. Acta de recepción
  - 4.8.1. Acto de recepción de las obras
  - 4.8.2. Figura del interventor
  - 4.8.3. Acta de recepción de las obras
- 4.9. Retirada y limpieza zonas de instalaciones
  - 4.9.1. Retirada zona de instalaciones
  - 4.9.2. Limpieza de zonas afectadas por las obras
  - 4.9.3. Retirada del equipo de obra
- 4.10. Expedientes posteriores (revisión de precios y posibles reclamaciones)
  - 4.10.1. Tipos de expedientes posteriores a la recepción de las obras
  - 4.10.2. Revisión de precios
  - 4.10.3. Expedientes de reclamación
  - 4.10.4. Cierre definitivo del expediente de obra



*Un programa integral y multidisciplinar que te permitirá superarte en tu carrera, siguiendo los últimos avances en el ámbito de la ingeniería civil”*

05

# Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: **el Relearning**.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.





“

*Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”*

## Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

*Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”*



*Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.*





*El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.*

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“ *Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores facultades del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción.

A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

*En 2019 obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.*

En TECH se aprende con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.





En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

*El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.*

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.




#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.

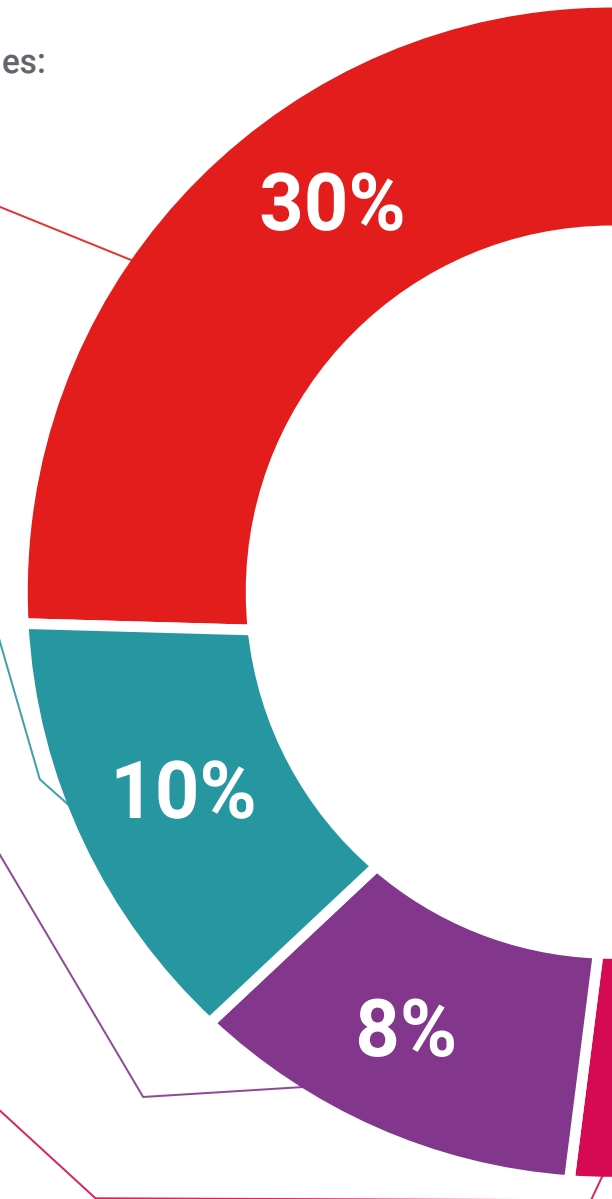



**Case studies**

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



**Resúmenes interactivos**

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



**Testing & Retesting**

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



06

# Titulación

El Experto Universitario en Gestión de Obras garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a dos diplomas de Experto Universitario, uno expedido por TECH Global University y otro expedido por la Universidad Latinoamericana y del Caribe.



“

*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

El programa del **Experto Universitario en Gestión de Obras** es el más completo del panorama académico actual. A su egreso, el estudiante recibirá un diploma universitario emitido por TECH Global University, y otro por la Universidad Latinoamericana y del Caribe.

Estos títulos de formación permanente y actualización profesional de TECH Global University y Universidad Latinoamericana y del Caribe garantizan la adquisición de competencias en el área de conocimiento, otorgando un alto valor curricular al estudiante que supere las evaluaciones y acredite el programa tras cursarlo en su totalidad.

Este doble reconocimiento, de dos destacadas instituciones universitarias, suponen una doble recompensa a una formación integral y de calidad, asegurando que el estudiante obtenga una certificación reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Este mérito académico le posicionará como un profesional altamente capacitado y preparado para enfrentar los retos y demandas en su área profesional.

Título: **Experto Universitario en Gestión de Obras**

Modalidad: **online**

Duración: **6 meses**

Acreditación: **24 ECTS**



\*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH Universidad ULAC realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presente calidad  
desarrollo web form  
aula virtual idiomas

**tech** universidad  
ULAC

## Experto Universitario Gestión de Obras

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 meses
- » Titulación: TECH Universidad ULAC
- » Acreditación: 24 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

# Experto Universitario Gestión de Obras

